



Propuesta para el desarrollo del sistema de manejo de reservaciones de instalaciones para Lares de mi Chamorra



10 de Febrero de 2006



1. Nuestro entendimiento de las necesidades de Lares de mi Chamarra


Requerimientos

Manejo de reservaciones de habitaciones:


Con el fin de mejorar y agilizar el proceso de manejo de reservaciones de habitaciones para Lares de mi Chamarrá se necesita la creación de un sistema que permita a los clientes realizar el proceso de reservación de habitaciones ajustado a las necesidades de los mismos a través del sitio web de Lares de mi Chamarrá de forma de auto servicio o con el apoyo del back office de la empresa.

Manejo de reservaciones de salones:

Para optimizar el manejo de las reservaciones de salones y facilitar el trabajo de los encargados de Lares de mi Chamarrá en la asignación de salones para los clientes, se necesita desarrollar un sistema para manejar las reservaciones de salones recibidas a través del sitio web del hotel. Así como facilitar el proceso de reservaciones conjunto de habitaciones y salones.



2. Propuesta de Servicios a Lares de mi Chamarra



2.1. Objetivos y Alcance

Objetivos

En base a las necesidades de Lares de mi Chamarra, se identificaron los siguientes objetivos a alcanzar en la aplicación que Global Web Technologies, Inc. desarrollará:

Manejo de reservaciones de habitaciones:

- Crear una aplicación para el manejo de reservaciones de habitaciones automatizado a través del sitio web en el cual el cliente pueda verificar la disponibilidad y hacer la pre-reservación
- Una vez hecha la prereservación, el sistema debe permitir enviar la confirmación del pago a través del website o del back office.

Manejo de reservaciones de salones:

- Crear una aplicación para el manejo de reservaciones de salones de Lares de mi Chamarra a través de su sitio web, mostrando la disponibilidad de salones y permitiendo hacer una pre-reservación hasta que se reporte el pago
- En ambos caso las pre-reservaciones deben permitir al cliente saber si existe una solicitud paralela de las mismas instalaciones y los límites de pago de las mismas según las secuencias que asigne el sitio web, así como la liberación de una reserva y el límite del pago del subsiguiente co-reservante.



Alcance

Para el logro de los objetivos planteados anteriormente, a continuación describiremos el alcance de nuestra propuesta de servicios:


Manejo de reservaciones de habitaciones:

- Diseño y configuración de una aplicación para Lares de mi Chamorra basada en Net2Client para manejar las reservaciones de habitaciones.
- Integración de la aplicación al sitio web de Lares de mi Chamorra.

Manejo de reservaciones de salones:

- Diseño y configuración de una aplicación para Lares de mi Chamorra basada en Net2Client para manejar las reservaciones de salones.
- Integración de la aplicación al sitio web de Lares de mi Chamorra.






2.2. Metodología y Plan de Trabajo

Metodología y Plan de Trabajo

Alcance


Fases a considerar para el desarrollo del proyecto:

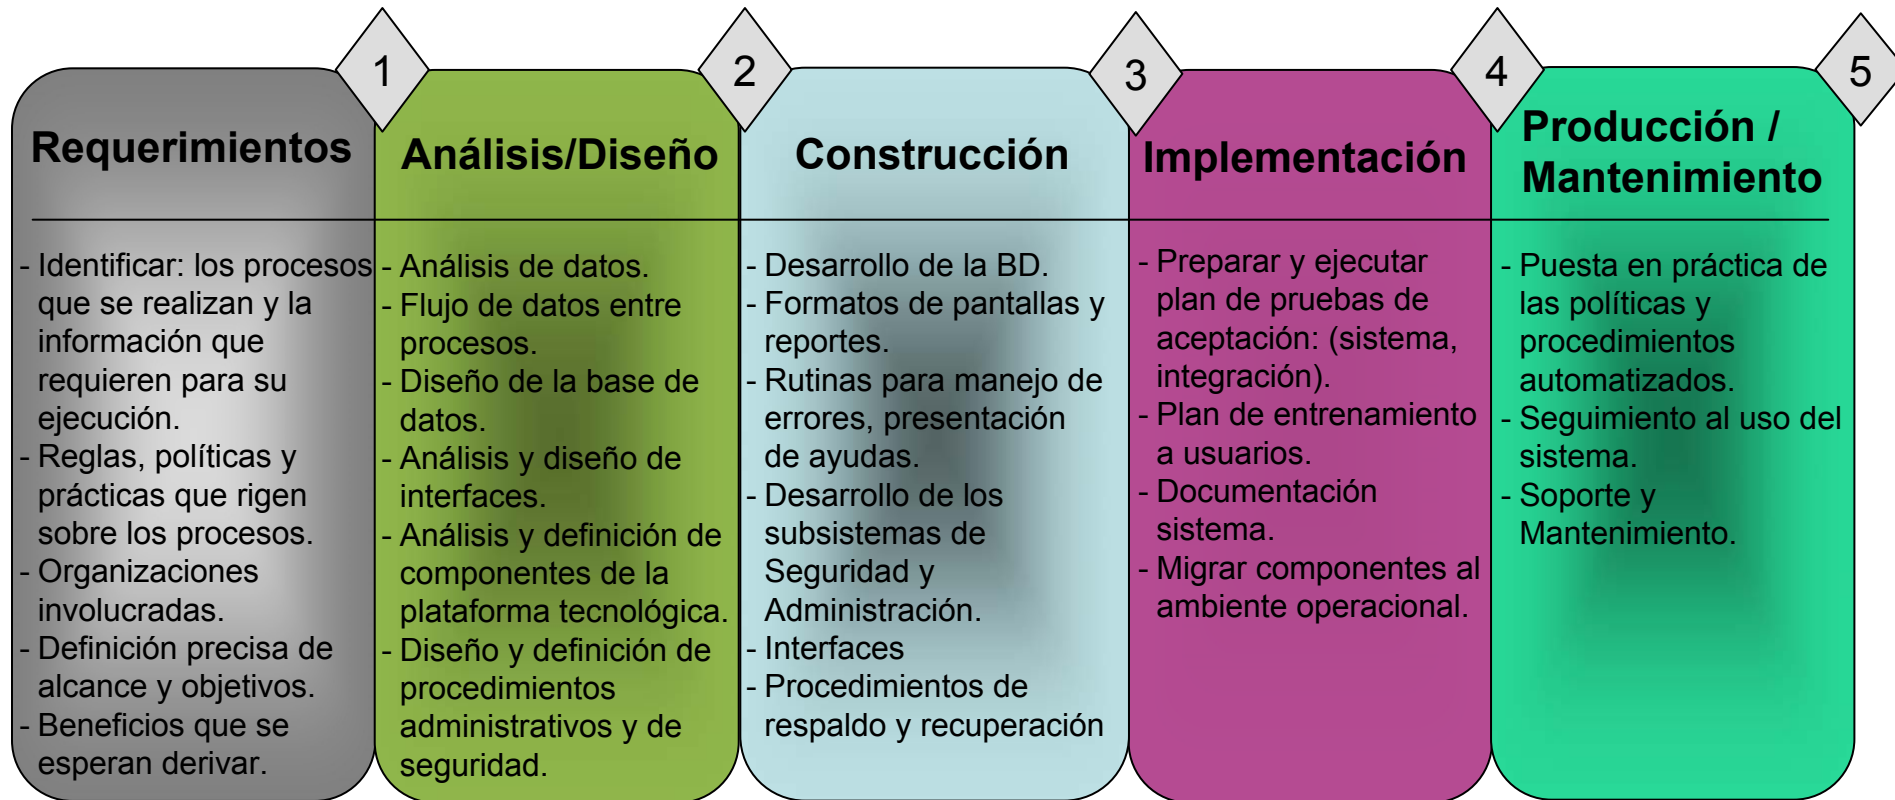

Metodología y Plan de Trabajo


Alcance

Las actividades de cada fase aportarán productos que servirán de insumo para la siguiente fase hasta completar la implantación del módulo correspondiente.

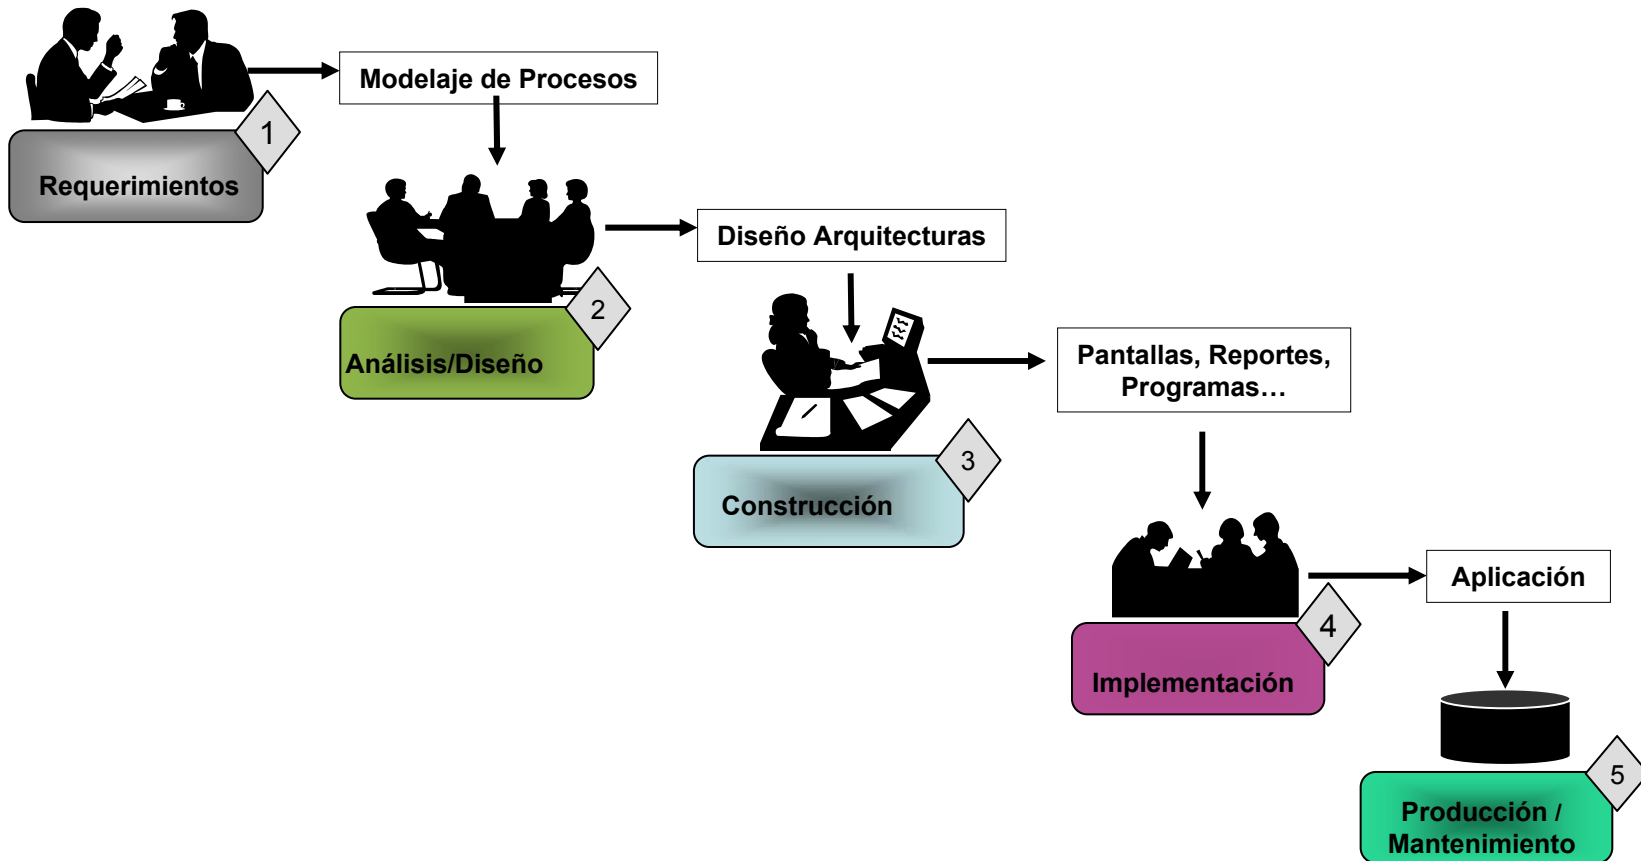

Metodología y Plan de Trabajo Sitio Web

Plan de Trabajo (En Semanas)	1	2	3	4	5	6	7	8
Requerimientos								
Levantamiento de la Información Clave del Sitio web (Datos, Procesos, Fuentes, Responsables). Producto: Matriz de Requerimientos; Plan de Diseño								
Análisis/Diseño								
Análisis de la Información recabada y Diseño de la Estructura del Sitio Web. Producto: Propuesta de Look and Feel y estructura del sitio								
Construcción								
A partir de la propuesta aprobada se procede a la construcción definitiva del sitio web. Producto: Sitio Web listo para pruebas								
Pruebas								
Con el Sitio Web listo para pruebas se procede con el Plan de Pruebas y se hacen los ajustes correspondientes. Producto: Sitio Web Definitivo								
Producción y Mantenimiento								
El Sistema Definitivo para al Ambiente de Producción y se adiestran a 5 usuarios. Producto: Aplicación en Producción;5 Usuarios Adiestrados								



2.3. Premisas y Supuestos Claves


Premisas y Supuestos Claves

Para la elaboración de la presente Propuesta de Servicios se han considerado las siguientes premisas:

- Lares de mi Chamarra asume la responsabilidad de asignar personal que asista en la realización de todas las actividades aquí previstas.
- El alcance fue definido en función de los datos recibidos y nuestra experiencia en proyectos similares.
- La validación y aprobación de las Actividades y Productos del Proyecto, por parte de Lares de mi Chamarra, debe llevarse a cabo dentro de un período no mayor a tres (3) días continuos, una vez definidos por el equipo del Proyecto.
- El trabajo definido en esta Propuesta de Servicios será realizado en las instalaciones de Global Web Tek.
- Todos los servicios del Proyecto serán realizados y completados en idioma español. Cualquier requerimiento adicional relativo a la documentación del Proyecto implicará una extensión al alcance del mismo.
- Todas las tareas asignadas a los Consultores de GWT y/o al personal de Lares de mi Chamarra, que participan en el Proyecto, deberán completarse según lo requerido para mantener el cronograma estipulado en el plan de trabajo del Proyecto.
- Lares de mi Chamarra, es responsable y estará encargado de la administración de la base de datos y los sistemas que soportan los ambientes de consulta, desarrollo, pruebas y producción, después de la ejecución del Proyecto (pase a Producción y Mantenimiento).

Premisas y Supuestos Claves

- Cualquier cambio en la conducción del negocio y/u organización que impacte el desarrollo del Proyecto según lo planificado en el plan de trabajo, podrá ser considerado como cambio de alcance al mismo, en cuyo caso se revisarán tanto los tiempos como los honorarios propuestos.
- La definición de cualquier procedimiento que surja como parte del Proyecto será completa responsabilidad de Lares de mi Chamarra, aún cuando los consultores pueden aportar sus conocimientos de las prácticas más comunes del negocio.
- Para la realización de las sesiones de levantamiento de requerimientos y análisis propuestos, así como de la definición de los criterios a utilizar en cada uno de ellos, Lares de mi Chamarra, asegurará y se comprometerá con la disponibilidad del personal clave a tiempo completo (100%) durante la ejecución de las sesiones, a fin de garantizar la adecuada transferencia de conocimientos y la aceptación de los cambios propuestos por el equipo del Proyecto.



3. Propuesta Económica

Propuesta Económica 1era Etapa

El costo de nuestra Propuesta de Servicios, de acuerdo con el alcance anteriormente mencionado es la siguiente:

Licencias de Uso Net2Client

- Licencia de uso de Net2Client:
 - Opción 1: Pago mensual de 315 mil Bs, pagados y ajustados trimestralmente según el índice de precios del consumidor de la ciudad de Caracas (IPC).
 - Opción 2: Un pago único de 3.655.000 Bs, y un pago mensual de 150 mil Bs, pagados y ajustados trimestralmente según el índice de precios del consumidor de la ciudad de Caracas (IPC).
 - Opción 3: Un pago único de 6.750.000 Bs, y un pago mensual de 50 mil Bs, pagados y ajustados trimestralmente según el índice de precios del consumidor de la ciudad de Caracas (IPC).

Sistema de control de prestamos

- Desarrollo del Sistema 9.300.000 Bs.

Propuesta Económica 1era Etapa (Continuación)

Este presupuesto contempla que la aplicación será alojada en los servidores de Globalwebtek y será utilizada por Lares de mi Chamorra bajo la modalidad de ASP (Application Service Provider) Por lo que todas las mejoras que sean incorporadas a Net2Client relativas al Kernel serán actualizadas automáticamente sin costo adicional para el cliente.

Este presupuesto no contiene el IVA ni impuesto alguno contemplado en la ley. Tiene una vigencia a partir del día de hoy, 10 de Febrero de 2006, de 20 días hábiles.

Documento de Firmas

Acordado:

**Lares de mi Chamarra,
Caracas, Venezuela**

Por:

Firma Autorizada

Cl.:
Cargo:

Fecha:

Fecha Estimada de Iniciación:
Fecha Estimada de Terminación:

Acordado:

Global Web Tek Venezuela, C.A.

Caracas, Venezuela

Por:

Firma Autorizada

Nombre: Valmore Riera

C.I.: 10.519,254
Cargo: Socio - Director

Fecha:
